

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO "CASA DEL MOSTO"

IMPRESA: FRARE COSTRUZIONI Piazza Stefanelli, 6- Barbisano di Pieve di Soligo (TV)

CERTIFICATO N."2" per il pagamento della SECONDA rata di EURO

€ 142.526,50 ESCLUSO IVA

Relativo al 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 31/10/2016)

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE		
n.	data	importo
1	03/10/2016	73.350,73

Visto il contratto in data 05 AGOSTO 2016 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.092.064,97 oltre ad € 10.920,00 per oneri per la sicurezza (1%); con uno sconto sui prezzi unitari (escluso oneri sicurezza) del 7,5989%.

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI	
a) per lavori e somministrazioni	244.201,97 *
b) sconto contratt. 7,5989% di a)	- 18.556,66
c) per Oneri per la sicurezza (1% di a) +	2.442,02
d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c) =	228.087,33
e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	228.087,33

Totale complessivo dei lavori o somministrazioni **228.087,33**

RITENUTE CONTRATTUALI	
Del 5% su lavori a)	12.210,10
Dedotto il totale delle ritenute	12.210,10
Rimane l'ammontare netto di	215.877,23
Dedotti i precedenti acconti di complessive	-73.350,73
Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA	142.526,50

IMPORTO DA FATTURARE ARROTONDATO **142.526,50**

ASSICURAZIONE INFORTUNI	
* INPS di TV n° pos. 8407246863	
* INAIL n° 90026234, pos. ass. 06024221	

CERTIFICA

che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla impresa la somma di :

oltre ad IVA al % pari :


per un totale di complessivo :

Conegliano , li 08/11/2016

Il Direttore dei Lavori

€ 142.526,50

Dot. Ing. Fulgi De Pol
Piazza Duca D'Aosta, 8
31016 Conegliano TV
Cod. Fiscale 02521940260
P.IVA 05521940260



Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 31/10/2016

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)

privato in data 05/08/2016 repertorio N° registrato a in data N° modello volume .

Importo Lordo del Progetto Euro	1.102.984,97	Data di Consegna dei Lavori	22/08/2016
<i>Importo Contrattuale dei Principali Lavori :</i>		Data di Inizio dei Lavori	22/08/2016
Importo Lordo pari a Euro 1.092.064,97		Giorni per Ultimazione dei Lavori	221
Importo per la sicurezza pari a Euro 10.920,00	10.920,00		
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro	1.009.080,04	Data Prevista Ultimazione Lavori	31/03/2017
<i>Importo Contrattuale dei Lavori Aggiuntivi a a seguito di Perizie di variante o suppletive:</i>		I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo Lordo pari a Euro		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo per la sicurezza pari a Euro		Totale giorni Sospensione-Proroga	
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro		Nuova Data Ultimazione dei Lavori	31/03/2017
Importo Netto di Aggiudicazione dei lavori Euro	1.020.000,04	Giorni Impiegati in più	
<i>Fondi a disposizione dell'amministrazione come da prospetto pagina successiva :</i>		Giorni Impiegati in meno	
Somma Complessiva Impegnata Euro	1.020.000,04	Penale per ritardo lavori	


Il 31/10/2016

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi



Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 31/10/2016

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
1	E.02.01.00.	Scavo di pulizia generale (mq.)	609,61	5,00	3.048,05	
2	E.02.02.00.	Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. (mc.)	686,28	4,70	3.225,52	
3	E.02.03.00.	Scavo di sbancamento (mc.)	5.329,25	4,50	23.981,63	
4	E.02.04.a.	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di profondità fino a ml. 2,00 (mc.)	55,23	9,90	546,78	
5	E.03.04.00.	Reinterri con materiale adiacente al cantiere (mc.)	250,47	4,30	1.077,02	
6	E.05.01.b.	Demolizione di fabbricati fuori terra con struttura portante e solai in c.a. (mc.)	3.507,08	5,40	18.938,23	
7	E.05.03.a.	Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in muratura di mattoni (mc.)	22,40	31,00	694,40	
8	E.05.03.b.	Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in cemento armato (mc.)	384,89	31,00	11.931,59	
9	E.05.07.c.	Demolizione di serramenti esterni metallici (mq.)	175,00	6,20	1.085,00	
10	E.05.07.d.	Demolizione di serramenti interni metallici (n.)	5,46	47,00	256,62	
11	E.05.25.a.	Smontaggio/rimozione di strutture e manufatti metallici: parapetti o simili, misura al metro quadrato effettivo. (mq.)	33,24	7,40	245,98	
12	E.05.25.b.	Smontaggio/rimozione di strutture e manufatti metallici: scale e strutture portanti, misura a peso (kg.)	3.376,10	0,31	1.046,59	
13	E.06.03.00.	Sgombero, carico e trasporto in discarica autorizzata materiale di demolizione (mc.)	1.620,00	4,90	7.938,00	
14	E.08.01.a.	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera: dosaggio a C 8/10 (mc.)	106,38	77,00	8.191,26	
15	E.08.04.00.A	Acciaio in barre B 450 C - solo opere di consolidamento (kg.)	1.803,47	0,85	1.532,95	
A Riportare Euro					83.739,62	

li, 31/10/2016

Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 31/10/2016

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
Riporto Euro					83.739,62	
16	E.08.04.00.B	Acciaio in barre D 450 C - strutture in genere (kg.)	100.000,00	0,86	86.000,00	
17	E.08.05.01.	Rete elettrosaldata a protezione pareti di scavo tra micropali (mq.)	461,01	10,80	4.978,91	
18	E.08.11.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a plinto o fondazioni continue (mc.)	62,55	138,00	8.631,90	
19	F.01.09.a.	Impianto di cantiere per micropali e tiranti (n.)	1,00	1.710,00	1.710,00	
20	P.001.b..	Perforazione verticale del diametro di mm. 220 e della lunghezza massima fino a ml. 12,00 (ml.)	703,40	29,00	20.398,60	
21	P.001.c..	al chilogrammo di armatura metallica S355, diametro mm. 168,3 spessore 10 mm. (kg.)	27.768,00	1,02	28.323,36	
22	P.007...	Strutture realizzate con profilati, piastrame ecc. (kg.)	8.899,92	0,88	7.831,93	
23	P.02.01.00.	Preparazione del piano di lavoro (n.)	1,00	209,00	209,00	
24	P.02.08.00.	Rimozione di lastre in cemento amianto ondulate o piane (kg.)	3.980,99	0,43	1.711,83	
25	P.02.10.00.	Intervento di incapsulamento di lastre o tegole in cemento amianto (mq.)	199,05	3,35	666,82	
PER I LAVORI A MISURA DEL S.A.L. SOMMANO Euro					244.201,97	244.201,97
IMPORTO LORDO LAVORI (a Misura) S.A.L. N° 2 Euro						244.201,97
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.:						
Per Ribasso del -7,5989% su Euro 244.201,97					-18.556,66	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro					-18.556,66	-18.556,66
PER IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA SOMMANO Euro						2.441,87
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N° 2 Euro						228.087,18
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI:						
Acconti corrisposti all'Impresa con i seguenti Certificati di Pagamento:						
Certificato di Pagamento n° 1 del S.a.l. n° 1 emesso in data 26/09/2016 per Euro					73.624,46	
PER CERTIFICATI DI PAGAMENTO PRECEDENTI Euro					73.624,46	73.624,46


li, 31/10/2016


L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi





Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Libretto delle Misure del S.a.l. N. 2

Libretto come da accordi

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)


li, 31/10/2016

L'Impresa Esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori

Dott. Ing. Luigi De Poi



Libretto delle Misure del S.a.I. N. 2

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
18	28/10/2016	E.02.02.00.	Lavoro... Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. area lato nord (vedere allegato) $24,70 \times (8,00 + 8,20) / 2 \times 0,50$ area lato ovest (vedere allegato) $(20,00 \times 3,50 \times 0,50)$ area lato est $(5,70 + 5,30) / 2 \times 8,20 \times 0,70 + (5,30 + 3,50) / 2 \times 24,40 \times 0,60 + (5,70 \times 4,60) \times 0,50 + (3,40 \times 1,50) \times 0,50$	100,04 35,00 111,65		
			mc.	246,69		246,69
19	28/10/2016	E.05.03.b.	Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in cemento armato Vedi disegno allegato "A" muro sostegno rampa lato sud $25,88 \times 0,30 \times (4,88 + 0,81) / 2$ fondazioni muro rampa lato sud $(25,88 \times 0,80 \times 0,60)$ platea rampa lato sud $21,70 \times (5,20 + 5,90) / 2 \times 0,20$ platea interrato $((5,00 \times 5,30) + ((19,50 + 20,85) / 2 \times 19,58) + (4,60 \times 1,20) + (5,41 \times 3,72) + (5,22 \times 4,26) + (3,55 \times 2,10)) \times 0,20$ zoccolo base ramp lato sud $(5,30 \times 0,80 \times 0,60)$ fondazioni perimetrali interrato $((20,85 + 15,33 + 6,50 + 5,80 + 5,41 + 1,20 + 1,50 + 29,99 + 1,90 + 2,15 + 4,00 + 4,00 + 23,79 + 4,90) \times 0,80 \times 0,60)$ fondazioni centrali interrato $(19,58 \times 1,20 \times 0,80) \times 2$ fondazioni trasversali interrato $(20,60 + 20,40 + 20,10) \times 0,60 \times 0,40$ parete interrata confine est $(24,50 + 5,50) \times 0,30 \times 3,15$ parete in interrato confine nord $(24,50 \times 0,30 \times 3,15)$ murature interrato fabbricato 7 Vedi tav. 1 - Tab. 3 $(6,60 + 7,50) \times 2 \times 0,30 \times 3,0$	22,09 12,42 24,09 95,37 2,54 61,11 37,59 14,66 28,35 23,15 25,38		
			mc.	346,75		346,75
20	28/10/2016	E.02.03.00.	Scavo di sbancamento area mostificio (vedere rilievo allegato) $(24,20 \times 24,50 \times 6,10) + (13,40 \times (24,20 + 29,40) / 2) \times 6,10$ area tunnel (vedere rilievo allegato) $((24,20 + 34,60) / 2 \times (6,70 + 10,70) / 2) \times 6,10$ dedurre ingombro fabbricato esistente $-((29,55 \times 1,53 / 2) + (9,08 \times 5,83) + (14,85 \times 20,22) + (5,20 \times 1,50) + (3,74 \times 1,00) + (4,71 \times 8,94) + (4,95 \times 5,80) + (7,58 \times 6,51) + (9,18 \times 3,34)) \times 3,11$ $-(4,26 \times 5,80) \times 3,11$ muro sostegno rampa lato sud	5.807,32 1.560,26	1.673,72 76,84	

li. 31/10/2016

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 2

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
21	28/10/2016	E.02.04.a.	-25,88*0,30*(4,88+0,81)/2 fondazioni muro rampa lato sud -(25,88*0,80*0,60) platea rampa lato sud -21,70*(5,20+5,90)/2*0,20 platea interrato -((5,00*5,30)+((19,50+20,85)/2*19,58)+(4,60*1,20)+(5,41*3,72)+(5,22*4,26)+(3,55*2,10))*0,20 dedurre scavo sezione aperta -((24,70*8,00*0,50)+(20,00*3,50*0,50))		22,09 12,42 24,09 95,37 133,80	
			mc.	7.367,58	2.038,33	5.329,25
			Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di profondità fino a ml. 2,00			
			plinti sostegno puntoni provvisori (part. C tav. 15/ca) (2,90*2,00)*1,00*6+(2,00*1,00)*0,60*6 area tunnel parte bassa rif. 10 tav. 1/ca (4,50*4,20*0,70)	42,00 13,23		
22	28/10/2016	E.08.05.01.	mc.	55,23		55,23
			Rete elettrosaldada a protezione pareti di scavo tra micropali			
			parete interrato lato est area mostificio (38,35*5,25) parete interrato lato nord area mostificio (24,26*5,25) parete interrato lato ovest area mostificio (25,20*5,25)	201,34 127,37 132,30		
			mq.	461,01		461,01
23	28/10/2016	P.007...	Strutture realizzate con profilati, piastrame ecc.			
			travi HEA 320 spezzoni base colonne (part. C tav. 15/ca.) (1,20*97,60)*6 travi HEA 320 puntoni orizzontali (part. A tav. 15/ca.) (9,35+8,95)*97,60 travi HEA 300 puntoni obliqui (part. C tav. 15/ca.) (8,60*88,30)*6 angolo 80*80*8 su puntoni in HEA 300 (6,00*9,66*2)*6 piastre (part. A tav. 15/ca.) puntoni orizzontali (0,60*0,38)*157*4+(0,27*5,55*6)*4+(0,723*0,245*118)*4+(0,5 59*0,260*157)*4 piastre (part. B tav. 15/ca.) puntoni obliqui (0,65*0,60*157)*6+(0,27*5,55*6)*6 piastre (part. C tav. 15/ca.) puntoni obliqui (0,35*0,35*157)*6+(0,396*0,350*157)*6+(0,441*0,221*118*2) *6	702,72 1.786,08 4.556,28 695,52 354,03 421,33 383,96		
			kg.	8.899,92		8.899,92

li, 31/10/2016


Libretto delle Misure del S.a.I. N. 2

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
24	28/10/2016	E.05.01.b.	Demolizione di fabbricati fuori terra con struttura portante e solai in c.a. iano interrato corpo di fabbrica rif. 1 (tavola n. 1 stato di fatto) $((29,55*1,53/2)+(9,08*5,83)+(14,85*20,22)+(5,20*1,50)+(3,74*1,00)+(4,71*8,94)+(4,95*5,80)+(7,58*6,51)+(9,18*3,34))*3,18$ piano interrato C.T. (tavola n. 1 stato di fatto) $(4,26*5,80)*3,18$ piano terra corpo di fabbrica rif. 3 (tavola n. 1 stato di fatto) $((19,77*14,02)+(4,92*1,42))*4,21$ piano terra corpo di fabbrica rif. 4 (tavola n. 1 stato di fatto) $((4,94*4,52)+(4,19*2,40))*3,37$ piano terra corpo di fabbrica rif. 5 (tavola n. 1 stato di fatto) $((4,59*4,19)+(3,51*2,66))*4,00$ piano terra corpo di fabbrica rif. 6 (tavola n. 1 stato di fatto) $((4,89*4,01)+(3,51*5,53))*4,45$ piano terra corpo di fabbrica rif. 7 (tavola n. 1 stato di fatto) $(6,60*7,50)*2,50$ dedurre quantità contabilizzata al 1° S.A -3157,08	1.711,39 78,57 1.196,32 109,14 114,27 173,64 123,75		
			mc.	3.507,08	3.157,08	350,00
25	28/10/2016	E.06.03.00.	Sgombero, carico e trasporto in discarica autorizzata materiale di demolizione Vedere elenco formulari cod. rifiuto CER. 17.09.04 - viaggi autocarro $(65*18,00)$	1.170,00		
			mc.	1.170,00		1.170,00
26	28/10/2016	E.08.11.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a plinto o fondazioni continue plinti base puntoni obliqui (part. C tav. 15/ca.) $(2,50*1,60*1,00)*6+(1,60*0,60*0,60)*6$	27,46		
			mc.	27,46		27,46
27	28/10/2016	E.08.11.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a plinto o fondazioni continue cordolo testa micropali lato est $(38,70*0,80*0,50)$ cordolo testa micropali lato nord $(23,46*0,80*0,50)$ cordolo testa micropali lato ovest $(25,58*0,80*0,50)$	15,48 9,38 10,23		
			mc.	35,09		35,09
28	28/10/2016	E.08.01.a.	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera: dosaggio a C 8/10 magrone fondo platea area mostificio (rif. 1/4-12/14 tav. 1/ca.)			




il, 31/10/2016

SCAVO PROFONDITA

Rif. Soglia Concetto

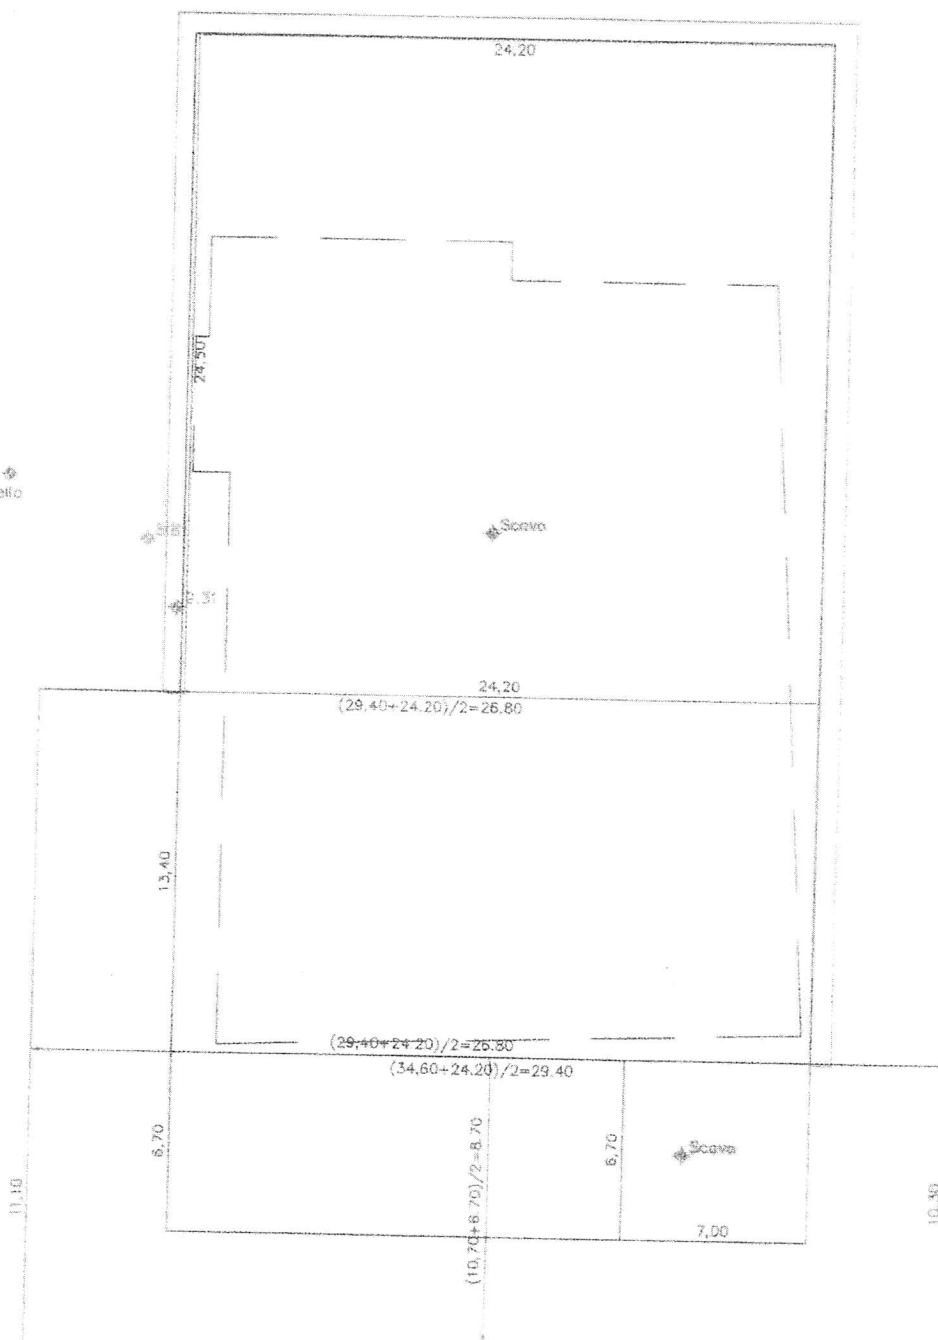


ACCIAIO (2° SAL)
 DU ATOLCAI 14 HED 320 ⇒ OND

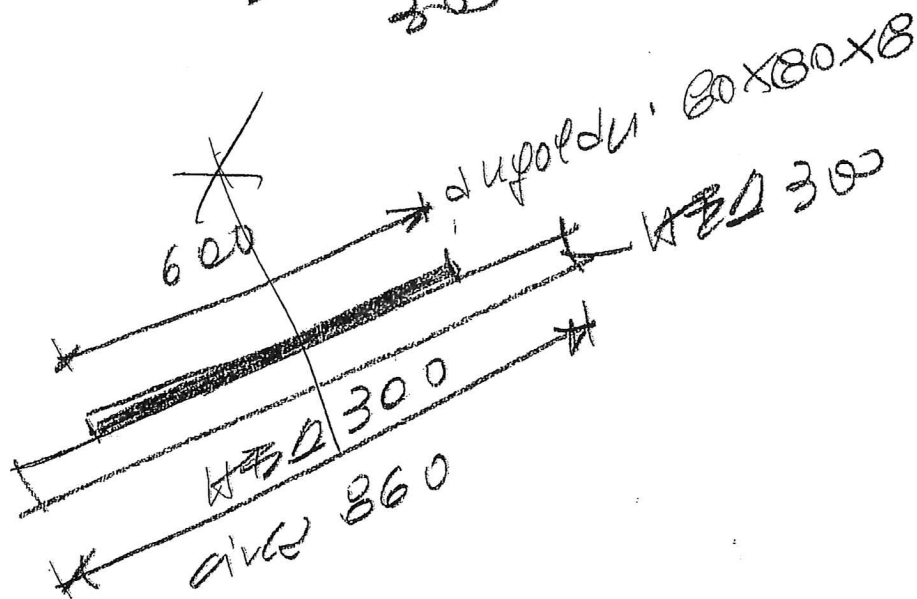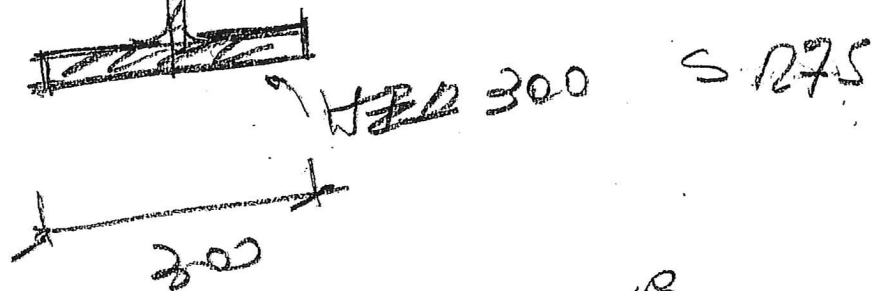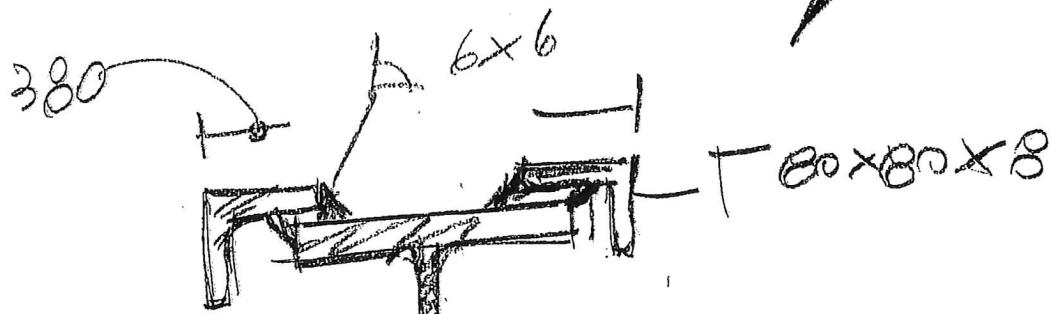

13/10/2016

12 D.L
 J. L



Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Libretto dei Ferri n. 2

Relativo al S.a.l. N. 2

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)


Il, 28/10/2016

Il Direttore dei lavori

Dott. Ing. Luigi De Poi

L'impresa esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.



86 / 89

Libretto dei Ferri n. 2

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio l'immagazzinamento...

Relativo al S.a.l. N. 2

N° Pr.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Descrizione dei Lavori e delle Provviste	FATTORI					Peso Totale
				Ø	Lunghezza	Numero	N° P.S.	Peso Unit.	
1	30/09/2016	E.08.04.00.A.	Acciaio in barre B 450 C - solo opere di consolidamento						
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	12,00 ✓	12,00 ✓	3,00 ✓	2,466 ✓	1.065,31 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	6,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	177,55 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	12,00 ✓	4,00 ✓	3,00 ✓	1,208 ✓	173,95 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	6,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	28,99 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - spezzoni)	20 ✓	0,60 ✓	4,00 ✓	4,00 ✓	2,466 ✓	23,67 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato est (tav. 15/ca - staffe)	10 ✓	2,70 ✓	156,00 ✓	1,00 ✓	0,617 ✓	259,88 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	12,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	355,10 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	9,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	266,33 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	6,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	177,55 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	12,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	57,98 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	9,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	43,49 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	6,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	28,99 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato nord (tav. 15/ca - staffe)	10 ✓	2,70 ✓	79,00 ✓	1,00 ✓	0,617 ✓	131,61 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	12,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	355,10 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	9,60 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	284,08 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	20 ✓	6,00 ✓	12,00 ✓	1,00 ✓	2,466 ✓	177,55 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	12,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	57,98 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	9,60 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	46,39 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - correnti)	14 ✓	6,00 ✓	4,00 ✓	1,00 ✓	1,208 ✓	28,99 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - spezzoni)	20 ✓	0,60 ✓	4,00 ✓	2,00 ✓	2,466 ✓	11,84 ✓
			✓ cordolo testa pali di fondazione lato ovest (tav. 15/ca - staffe)	10 ✓	2,70 ✓	99,00 ✓	1,00 ✓	0,617 ✓	164,92 ✓
			✓ plinti base puntoni obliqui (part. C tav. 15/cs.) - staffoni	16 ✓	4,04 ✓	16,00 ✓	6,00 ✓	1,578 ✓	612,01 ✓
			✓ plinti base puntoni obliqui (part. C tav. 15/cs.) - staffoni	12 ✓	5,20 ✓	16,00 ✓	6,00 ✓	0,888 ✓	443,29 ✓
			✓ plinti base puntoni obliqui (part. C tav. 15/cs.) -						

Il, 28/10/2016

Libretto dei Ferri n. 2

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio l'immagazzinamento...

Relativo al S.a.l. N. 2

N° Pr.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Descrizione dei Lavori e delle Provviste	FATTORI					Peso Totale
				Ø	Lunghezza	Numero	N° P.S.	Peso Unit.	
		✓	riprese	16	2,78	8,00	6,00	1,578	210,57
		✓	plinti base puntoni obliqui (part. C tav. 15/cs.) - correnti	16	1,60	4,00	6,00	1,578	60,60
			kg.						5.243,72
Peso Totale del Libretto dei Ferri									5.243,72

Il, 28/10/2016

Il Direttore dei lavori

L'impresa esecutrice

Dott. Ing. Luigi De Poi


Frare Costruzioni S.r.l.


art. E.02.14.00. Acciaieria con profilo acciaio fine a 55 kg/mc


quindi: mc. 62,55 x 55 kg/mc acciaio previsto = 3440,25

3440,25 -

1803,47







LAMINATI - PROFILATI - TUBI MECCANICI - ACQUA - GAS - OSSITAGLIO - PIEGATURA LAMIERE



DIEGO BUTTIGNOL SRL

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.

30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)

Via Levada, 152 - Tel. 0421 275873 - Fax 0421 274553

www.diegobuttignol.it

Reg. Impr. di Venezia n. VE02709960278 - R.E.A. n. 234539

Codice Fiscale e Partita IVA 02709960278

Filiale: 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

Vicolo Mattei, 12 - Tel. 0422 371262 (r.a.) - Fax 0422 371274

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 14.08.96 n. 472)



N. **6840/001** DEL **13/10/16**
AGENTE

768800
DESTINATARIO

Foglio n. 1

VENDITA DIRETTA TV

CLIENTE

FRARE COSTRUZIONI SRL

**PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGOTV**

**PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGO TV
P.I. 03569930260**

CODICE CLIENTE **007775** TRASPORTO A CURA DEL ☐ MITTENTE ☒ DESTINATARIO ☐ VETTORE
CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

VETTORI RESIDENZA O DOMICILIO DATA RITIRO ORA FIRMA VETTORE
FIRMA DESTINATARIO

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

DATA **13/10/16**

ORA **10,07 Da Concordia Sagittaria**

FIRMA CONDUCENTE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) U.M. QUANTITÀ

**Ns.Rifer.Ordine del 10/10/16 Num. 1607670
Vs.Rifer.Ordine del 10/10/16 Num. RIF. ORD. 160-16**
01HEA320 TRAVE HEA 320 A MISURA S355 KG 679,00
90 CERTIFICATO NR 1,00

I certificati di qualità del materiale,
si rilasciano solo se richiesti in fase
d'ordine e verranno addebitati a
Euro 5,00 cad.

"LE LEGATURE DEI MATERIALI NON SONO
GARANTITE ALL'AGGANCIO DIRETTO PER
IL SOLLEVAMENTO. SI RACCOMANDA DI
USARE IDONEE IMBRAGATURE"

A decorrere dal 01.5.2006 il peso delle
TRAVI e dei FERRI U è calcolato a
"peso teorico" tabellare. Le tolleranze
sulla massa sono in conformità alle
norme UNI EN 10034 e UNI EN 10279.

PAGATO

DIEGO BUTTIGNOL s.r.l.

Via Levada, 152 - Tel. 0421.275873

30023 CONCORDIA SAGITTARIA/VE

Partita IVA Cod. Fisc.: 02709960278

Capitale Sociale € 100.000,00 = i.v.

PESA MERCE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PESO

COLLI

Porto Franco

Prodotti siderurgici

679,0000

Rinfusa

IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE CONTROLLATO PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE. IL MATERIALE TAGLIATO O COMUNQUE LAVORATO NON VERRÀ ACCETTATO IN RESTITUZIONE. NON SI ACCETTANO RECLAMI DOPO 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE.
CONDIZIONI DI VENDITA: Eventuali differenze di peso avranno valore oltre le normali tolleranze di legge equivalenti al 3% e verranno riconosciute unicamente con cartellino di peso pubblica. Il materiale spedito deve essere collaudato dal cliente prima dell'inizio della lavorazione. La Diego

LAMINATI - PROFILATI - TUBI MECCANICI - ACQUA - GAS - OSSITAGLIO - PIEGATURA LAMIERE



DIEGO BUTTIGNOL SRL

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.

30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)

Via Levada, 152 - Tel. 0421 275873 - Fax 0421 274553

www.diegobuttignol.it

Reg. Impr. di Venezia n. VE02709960278 - R.E.A. n. 234539

Codice Fiscale e Partita IVA 02709960278

Filiale: 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

Vicolo Mattei, 12 - Tel. 0422 371262 (r.a.) - Fax 0422 371274

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 14.08.96 n. 472)



N.	DEL
6898/001	14/10/16
AGENTE	

768894

Foglio n. 1

VENDITA DIRETTA TV

DESTINATARIO

CLIENTE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGOTV

PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGO TV
P.I. 03569930260

CODICE CLIENTE	TRASPORTO A CURA DEL	SPEDIZIONE A MEZZO	
007775	<input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE		
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DESTINATARIO	
VENDITA			
VETTORI	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA	RITIRO ORA
			FIRMA VETTORE

IZIO TRASPORTO O CONSEGNA

DATA 14/10/16

ORA 17,19 Da Concordia Sagittaria

FIRMA CONDUCENTE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ
	Ns.Rifer.Ordine del 14/10/16 Num. 1607826		
	Vs.Rifer.Ordine del 14/10/16 Num. RIF. ORD.	165-16	
1HEA300	TRAVE HEA 300 A MISURA	KG	4.551,00
1A80X8	FERRO ANGOLO 080X080X08	KG	696,00
0	CERTIFICATO	NR	2,00
<p>I certificati di qualità del materiale, si rilasciano solo se richiesti in fase d'ordine e verranno addebitati a Euro 5,00 cad.</p> <p>"LE LEGATURE DEI MATERIALI NON SONO GARANTITE ALL'AGGANCIO DIRETTO PER IL SOLLEVAMENTO. SI RACCOMANDA DI USARE IDONEE IMBRAGATURE"</p> <p>A decorrere dal 01.5.2006 il peso delle TRAVI e dei FERRI U è calcolato a "peso teorico"tabellare.Le tolleranze sulla massa sono in conformità alle norme UNI EN 10034 e UNI EN 10279.</p>			

MERCE	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO	COLLI
rtto Franco	Prodotti siderurgici	5247,0000	Rinfusa

ERIALE DOVRA' ESSERE CONTROLLATO PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE. IL MATERIALE TAGLIATO O COMUNQUE LAVORATO NON VERRA' ACCETTATO IN RESTITUZIONE NON SI ACCETTANO RECLAMI DOPO IL RICEVIMENTO DELLE NOTIZIE DI VENDITA: Eventuali differenze di peso saranno valute oltre le normali tolleranze.

LAMINATI - PROFILATI - TUBI MECCANICI - ACQUA - GAS - OSSITAGLIO - PIEGATURA LAMIERE

**DIEGO BUTTIGNOL SRL**

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.

30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)

Via Levada, 152 - Tel. 0421 275873 - Fax 0421 274553

www.diegotbuttignol.it

Reg. Impr. di Venezia n. VE02709960278 - R.E.A. n. 234539

Codice Fiscale e Partita IVA 02709960278

Filiale: 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

Vicolo Mattei, 12 - Tel. 0422 371262 (r.a.) - Fax 0422 371274

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

(D.P.R. 14.08.96 n. 472)

Foglio n. 1

N.	DEL
6674/001	06/10/16
AGENTE	
VENDITA DIRETTA TV	

768510

DESTINATARIO

CLIENTE

FRARE COSTRUZIONI SRL**PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGO TV****PIAZZA STEFANELLI, 6
31050 BARBISANO DI PIEVE DI SOLIGO TV
P.I. 03569930260**

CODICE CLIENTE	TRASPORTO A CURA DEL	SPEDIZIONE A MEZZO
007775	<input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE	

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

VETTORI	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA	RITIRO	ORA	FIRMA VETTORE

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA


FIRMA CONDUCENTE


DATA **06/10/16**ORA **17,32 Da Concordia Sagittaria**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ
01HEA320	TRAVE HEA 320 A MISURA INCLINATO	KG	1.856,00
90	CERTIFICATO 3.1 + CE	NR	1,00
<p>Ns.Rifer.Ordine del 6/10/16 Num. 1607570 Vs.Rifer.Ordine del 6/10/16 Num. RIF ORD. 159-16</p> <p>I certificati di qualità del materiale, si rilasciano solo se richiesti in fase d'ordine e verranno addebitati a Euro 5,00 cad.</p> <p>"LE LEGATURE DEI MATERIALI NON SONO GARANTITE ALL'AGGANCIO DIRETTO PER IL SOLLEVAMENTO. SI RACCOMANDA DI USARE IDONEE IMBRAGATURE"</p> <p>A decorrere dal 01.5.2006 il peso delle TRAVI e dei FERRI U è calcolato a "peso teorico" tabellare. Le tolleranze sulla massa sono in conformità alle norme UNI EN 10034 e UNI EN 10279.</p>			
<p>PAGATO</p> <p>DIEGO BUTTIGNOL s.r.l. Via Levada, 152 - Tel. 0421.275873 30023 CONCORDIA SAGITTARIA/VE Partita IVA Cod. Fisc.: 02709960278 Capitale Sociale € 100.000,00 = I.v</p>			

RESA MERCE	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO	COLLI
Porto Franco	Prodotti siderurgici	1856,0000	Rinfusa
ANNOTAZIONI			

IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE CONTROLLATO PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE. IL MATERIALE TAGLIATO O COMUNQUE LAVORATO NON VERRÀ ACCETTATO IN RESTITUZIONE. NON SI ACCETTANO RECLAMI DOPO 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE.
 CONDIZIONI DI VENDITA: Eventuali differenze di peso avranno valore oltre le normali tolleranze di legge equivalenti al 3% e verranno riconosciute unicamente con cartellino di pesa pubblica. Il materiale spedito deve essere collaudato dal cliente prima dell'inizio della lavorazione. La Diego





Ferrobeton

**FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO**
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09

SPETTABILE
FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO
31053 PIEVE DI SOLIGO TV

DESTINAZIONE
CANTIERE DI
VITTORIO VENETO TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)		N° 2.502	DEL 28/09/2016
PAGAMENTO R.T.BA. 30/60GG FISSO 10		CODICE CLIENTE 233	
APPOGGIO BANSAPHO E.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI		PARTITA IVA 03569930260	

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO
TRASINC	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16 CANTIERE DI VITTORIO VENETO TRASPORTO FORFAIT PER CARICO INCOMPLETO	NR	1	
F070	FERRO DIRITTO SAGOMATO IN MONTE	KG	270	
F301	FERRO POSTO IN OPERA PER CORDOLO SOPRA MICRO PALI - CANTINA	KG	3.880	
MAT	FERRO PER LEGATURE ALLEGATI DISEGNI, SPEZZONI, ATTESTAI	KG	20	
Peso netto Kg. 4.170 Data Produzione: 27/09/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.3				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

NOSTRO		28/09/2016	
TRASPORTO A MEZZO	FIRMA DEL CONDUCENTE	DATA PARTENZA	TARGA DEL MEZZO
VENDEITA		ORA ARRIVO	ORA FINE SCARICO
CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO	VETTORE	

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

31040 Nervesa della Battaglia (TV) Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com
35010 Villafranca Padovana (PD) Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15 Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com



Ferrobeton

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO TV

DESTINAZIONE
CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)

N°

2.628

DEL

11/10/2016

PAGAMENTO

RI.BA. 30/60GG FISSO 10

CODICE CLIENTE

C 233

APPOGGIO BANCARIO

B.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI

PARTITA IVA

03569930260

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO
F200	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16 CANTIERE DI VITTORIO VENETO GABBIE A PIE' D'OPERA ARMATURA PLINTI PART. C - PARZIALE	KG	890	
F070	FERRO DIRITTO SAGOMATO IN MONTE ARMATURA ANCORAGGI ALLEGATI ATTESTATI	KG	600	
Peso netto Kg. 1.490 Data Produzione: 10/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.S				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

VOSTRO

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

11/10/2016

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA


CAUSALE DEL TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

31040 Nervesa della Battaglia (TV) Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com
35010 Villafranca Padovana (PD) Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15 Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com



Ferrobeton

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO TV

DESTINAZIONE
CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)

N°

2.694

DEL

18/10/2016

PAGAMENTO

RI.BA. 30/60GG FISSO 10

CODICE CLIENTE

C 233

APPOGGIO BANCARIO

B.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI

PARTITA IVA

03569930260

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
F200	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16 CANTIERE DI VITTORIO VENETO GABBIE A PIE' D'OPERA PLINTI PART. C - COMPL.	KG	450	
Peso netto Kg. 450 Data Produzione: 07/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.S				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

VOSTRO

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

18/10/2016

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA

CAUSALE DEL TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A

Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com


35010 Villafranca Padovana (PD)

Loc. Tagli di Sotto - via Olmeo, 15

Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com

40277
GRIL

SANTE 320/3790010



Ferrobeton

**FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/08**

SPETTABILE	
FRARE COSTRUZIONI SRL	
PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO	
31053	PIEVE DI SOLIGO TV
DESTINAZIONE	
CANTIERE DI	
VITTORIO VENETO	TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)		N° 2.758	DEL 24/10/2016
PAGAMENTO RI.BA. 30/60GG FISSO 10		CODICE CLIENTE C 233	
APPOGGIO BANCARIO B.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI		PARTITA IVA 03569930260	

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
F301	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16			
	CANTIERE DI VITTORIO VENETO			
MAT	FERRO POSTO IN OPERA PER	KG	1.710	
	FERRO PER LEGATURE	KG	150	
	ARMATURA PLATEA INTERRATO			
F301	W.-5.30 PARTE 1			
	FERRO POSTO IN OPERA PER	KG	24.140	
	ARMATURA PLATEA			
	ARMATURA PLATEA INTERRATO			
	W.-5.30 PARTE 2			
	CONSEGNA PARZIALE			
	ALLEGATI ATTESTATI E SPEZZONI			


Peso netto Kg. 26.000 Data Produzione: 24/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.S

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

NOSTRO		24/10/2016	
TRASPORTO A MEZZO	FIRMA DEL CONDUCENTE	DATA PARTENZA	TARGA DEL MEZZO
VENDITA		ORA ARRIVO	ORA FINE SCARICO
CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO	VETTORE	

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

31040 Nervesa della Battaglia (TV)	Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A	Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com
35010 Villafranca Padovana (PD)	Loc. Tagli di Sotto - via Olmeo, 15	Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com



Ferrobeton

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO

TV

DESTINAZIONE

CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)

N°

2.746

DEL

24/10/2016

PAGAMENTO

RI.BA. 30/60GG FISSO 10

CODICE CLIENTE

C 233

APPOGGIO BANCARIO

B.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI

PARTITA IVA

03569930260

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
F301	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16 CANTIERE DI VITTORIO VENETO FERRO POSTO IN OPERA PER ARMATURA PLATEA PLATEA INTERRATO Q. -5.30 PARTE 1 - CONSEGNA PARZIALE - ALLEGATI ATTESTATI E SPEZZONI	KG	31.490	
Peso netto Kg. 31.490 Data Produzione: 21/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.S				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

NOSTRO

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

24/10/2016

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA

CAUSALE DEL TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

ORA ARRIVO

ORA FINE SCARICO

VEETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

040 Nervesa della Battaglia (TV)

Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A


Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com

010 Villafranca Padovana (PD)

Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15

Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com

001.1
001



Ferrobeton

**FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09**

SPETTABILE	
FRARE COSTRUZIONI SRL	
PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO	
31053	PIEVE DI SOLIGO TV
DESTINAZIONE CANTIERE DI	
VITTORIO VENETO	TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)		N°	2.780	DEL	26/10/2016
PAGAMENTO RI.BA. 30/60GG FISSO 10		CODICE CLIENTE C 233			
APPOGGIO BANCARIO B.C.Ç. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI		PARTITA IVA 03569930260			

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
F301	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16 CANTIERE DI VITTORIO VENETO FERRO POSTO IN OPERA PER PLATEA INTERRATO Q.-5.30 PARTE 2	KG	13.600	
F301	FERRO POSTO IN OPERA PER CHIUSURA PLATEA INTERRATO Q.-5.20	KG	1.250	
F301	FERRO POSTO IN OPERA PER ARMATURA PLATEA PLATEA INTERRATO Q.-5.20 PARTE 3°	KG	13.670	
MAT	CONSEGNA PARZIALE FERRO PER LEGATURE ALLEGATI ATTESTATI E SPEZZONI	KG	130	
Peso netto Kg. 28.650 Data Produzione: 24/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.S				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee Imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento ai sensi del DM 14/01/2008

NOSTRO		26/10/2016	
TRASPORTO A MEZZO	FIRMA DEL CONDUCENTE	DATA PARTENZA	TARGA DEL MEZZO
VENDITA	<i>m m</i>	ORA ARRIVO <i>14,30</i>	ORA FINE SCARICO <i>16,30</i>
CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO	VETTORE	

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

1040 Nervesa della Battaglia (TV) Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com
5010 Villafranca Padovana (PD) Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15 Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com



Ferrobeton

**FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
ARMATURE PER CALCESTRUZZO RINFORZATO
STABILIMENTO DI NERVESA**
Attestato Denuncia Attività Centro di Trasformazione N. 057/09

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO

TV

DISTINZIONE

CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14 agosto 1996)

N° 2.797

DEL 27/10/2016

PAGAMENTO

RI.BA. 30/60GG FISSO 10

CODICE CLIENTE

C 233

APPOGGIO BANCARIO

B.C.C. DELLE PREALPI (TARZO-TV) P.ZZA VITTORIO EMANI

PARTITA IVA

03569930260

Eventuali reclami devono farsi entro 3 gg. dal ricevimento della merce.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
F301	RIF.CONTR. NR. C233.1161/16			
MAT	CANTIERE DI VITTORIO VENETO			
	FERRO POSTO IN OPERA PER	KG	19.830	
	FERRO PER LEGATURE	KG	110	
VARIO	PLATEA INTERRATO Q.-5.20 PARTE 3			
	SACCONI PORTAGANCI	NR	9	
	ALLEGATI ATTESTATI E SPEZZONI			
<p>Peso netto Kg. 19.940 Data Produzione: 26/10/16 Prove controllo interno fatte eseguire da D.T.3</p>				

ATTENZIONE: Legacci non portanti non idonei al sollevamento tramite aggancio diretto. Utilizzare idonee imbracature.
Prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico di Stabilimento al sensi del DM 14/01/2008

NOSTRO

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

27/10/2016

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA

CAUSALE DEL TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

ORA ARRIVO

ORA FINE SCARICO

VETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

10 Nervesa della Battaglia (TV)

Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A

Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com

0 Villafranca Padovana (PD)

Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15

Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com

